PROCES VERBAL DE RECEPTION AVANT MISE (OU REMISE) EN SERVICE
ESCALIB MILLS MDS ou MINI ESCALIB MILLS

☐ ***Assemblage et 1ère mise en service*** ☐ ***Déplacement*** ☐ ***Ajout ou suppression d'éléments***

Seul l'installateur est autorisé à modifier l'Escalib Mills MDS ou le Mini Escalib Mills à la demande du donneur d'ordre.

Donneur d'ordre – Utilisateur : .....
Nom du chantier : .....
Localisation sur le chantier : .....
Nom du vérificateur : .....

DESCRIPTIF DE L'Escalib Mills MDS ou du Mini Escalib Mills
Nombre de modules : .....
Hauteur desservie : .....

CONTROLE DE L'ESCALIB MILLS MDS OU DU MINI ESCALIB MILLS

		Conformité Oui	Conformité Non
1	**Montage suivant :** ·· **La notice technique.** ou ·· **Le plan n°**..... **du**	☐	☐
2	**Assise au sol / Réglage des pieds.**	☐	☐
3	**Horizontalité / verticalité de l'Escalib.**	☐	☐
4	**Orientation de l'Escalib suivant la dalle à desservir. Sortie entièrement sécurisée.**	☐	☐
5	**Accessibilité au pied de l'Escalib par au moins 1 des 2 faces d'entrée (face principale A ou secondaire B).**	☐	☐
6	**Assemblage des modules et de l'embase : Présence des 4 vis M24, correctement serrées.**	☐	☐
7	**Présence indispensable et bon positionnement du garde-corps de fermeture et de son boulon.**	☐	☐
8	**Sur le module de tête, lisse de montage en position verticale si la dalle à desservir se situe face B ou en position horizontale pour les autres faces.**	☐	☐
9	**Hormis la face desservant la dalle, verrouillage correct de toutes les lisses garde-corps.**	☐	☐
10	**Amarrage de l'Escalib conforme à la notice technique et/ou au plan.**	☐	☐
11	**Absence de déformation permanente ou de corrosion significative des éléments de la structure.**	☐	☐

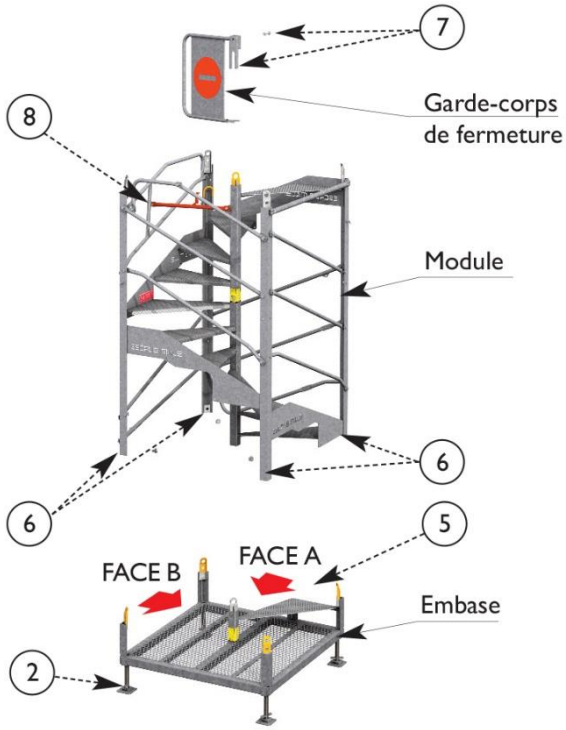

Mills
Echafaudage - Etaiement - Coffrage
82, RUE EDOUARD VAILLANT
93351 LE BOURGET CEDEX
T. : 01 48 35 65 65 - F. : 01 48 37 20 52

Respecter la notice technique Escalib Mills disponible sur **www.mills.fr**

COMMENTAIRES

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pour toute case « NON » cochée, des modifications ou des remplacements devront être effectués avant utilisation de l'Escalib Mills MDS ou du Mini Escalib Mills. Une nouvelle vérification sera programmée suite aux corrections d'un ou des éléments non-conformes.

AUTORISATION D'UTILISATION

OUI ☐ **NON** ☐ **Date*** _____

Visa du contrôleur :

**** A compter de ce jour, le donneur d'ordre assurera le gardiennage et le bon état de conservation de l'Escalib Mills MDS ou du Mini Escalib Mills jusqu'au démontage.***
